甲斐市生活排水処理施設整備構想 【アクションプラン】

■目標年次	令和8年度

■手法毎の汚水処理整備区域

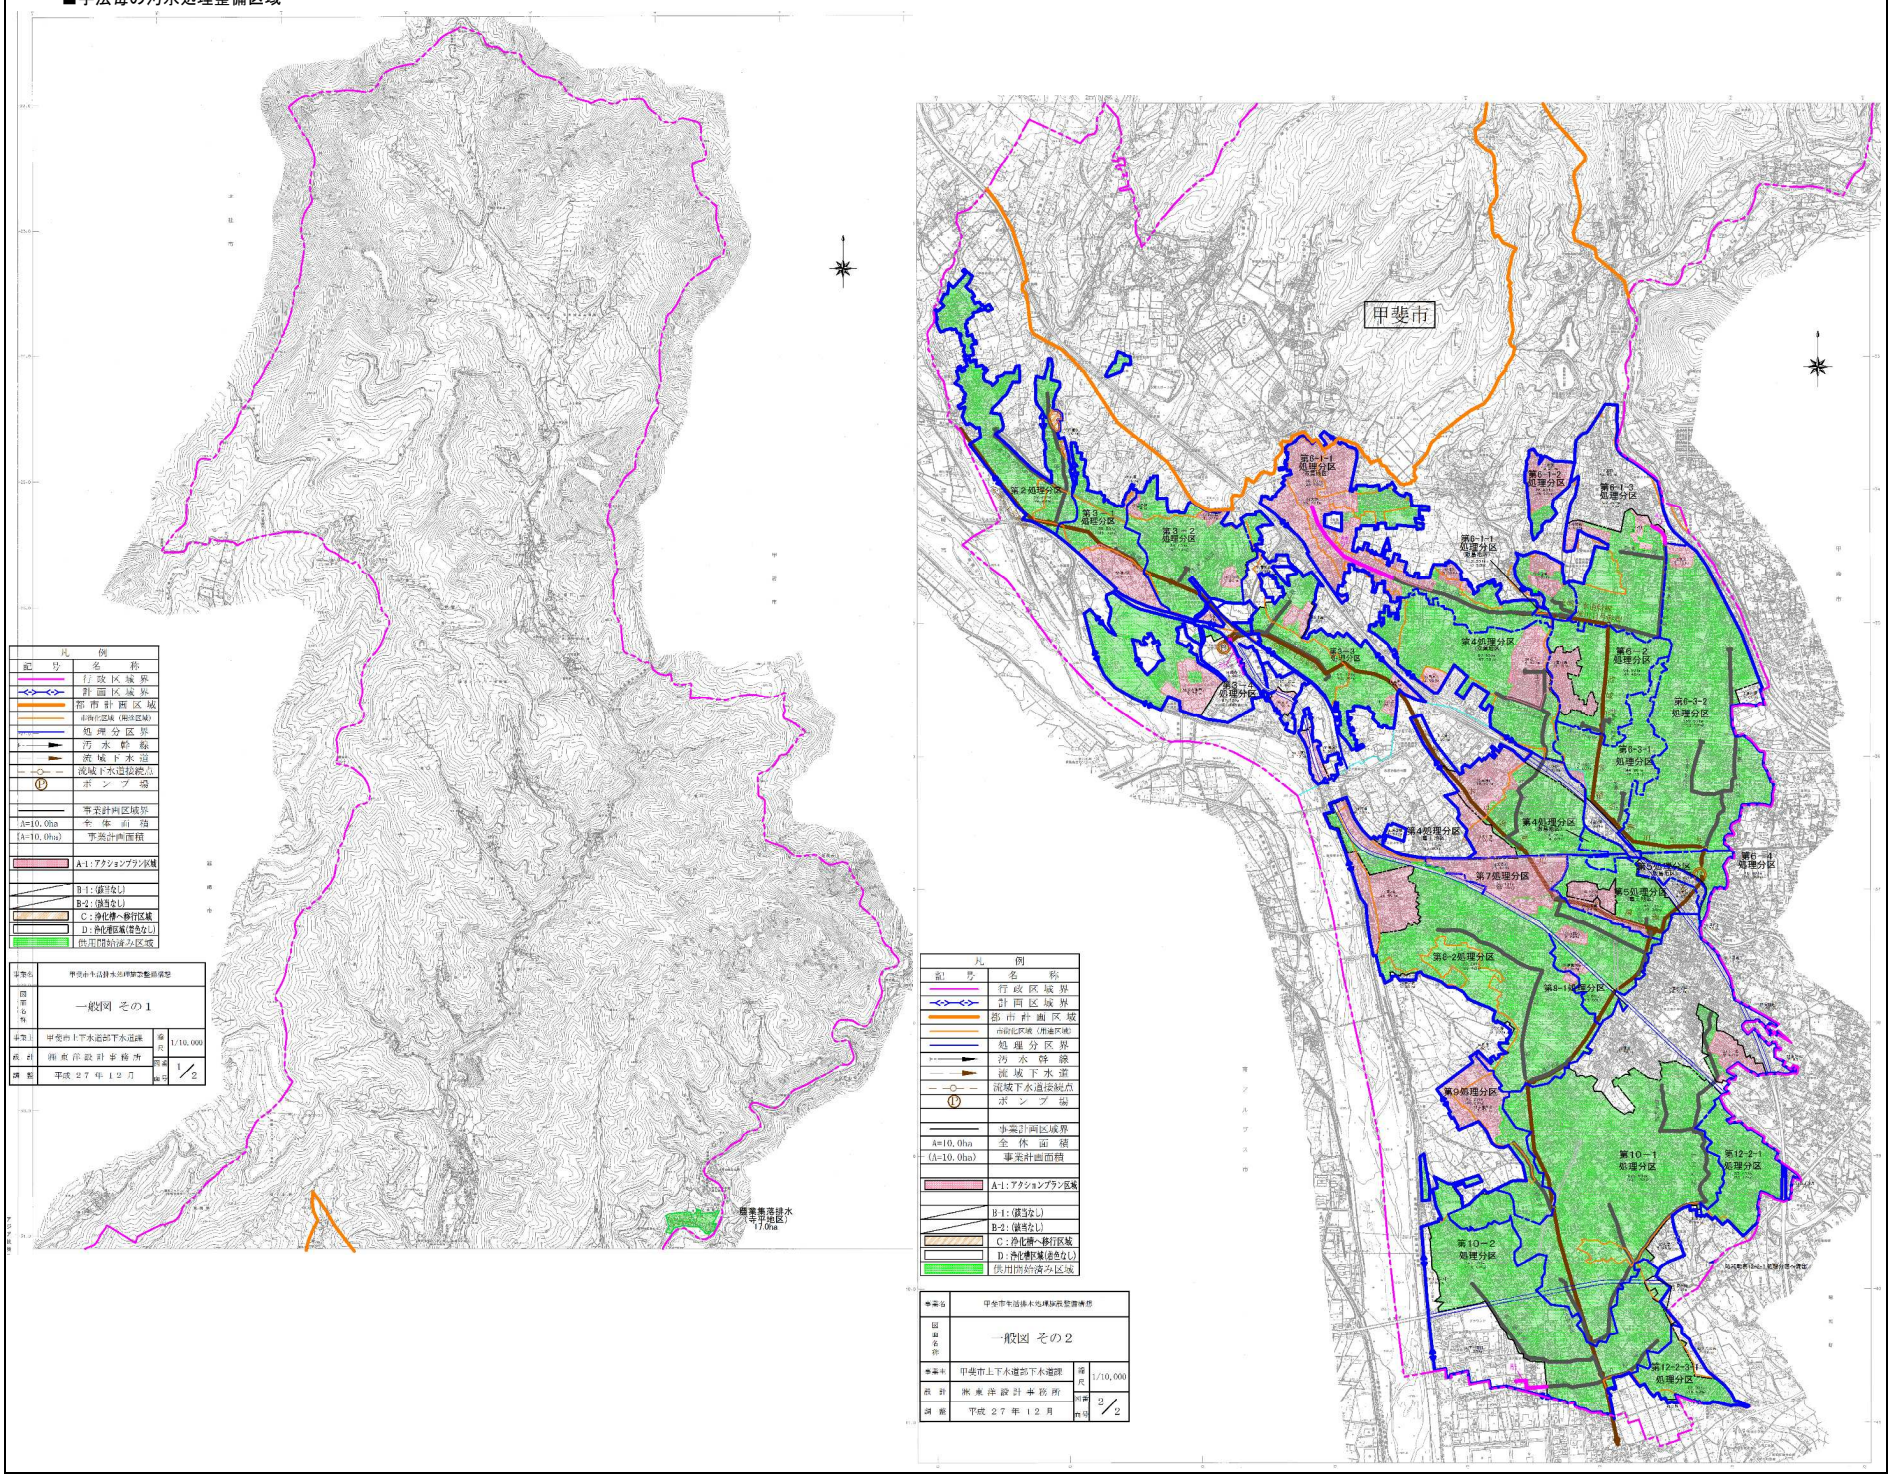

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1 平成28年	2 平成29年	3 平成30年	4 令和1年	5 令和2年	6 令和3年	7 令和4年	8 令和5年	9 令和6年	10 令和7年	11 令和8年
施設整備	下水道	事業計画区域、用途区域内を重点的に整備											
	農集排												
	浄化槽	市設置型合併浄化槽整備推進事業											
		浄化槽設置整備事業											
実行メニュー （早期概成）	共通	クイックプロジェクト等を利用した整備の実施											
		戸別訪問等による転換促進											

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他（コミプラ）	備考（早期概成手法の内容）
					個人設置型	市町村設置型		
整備手法	整備人口（人）	7,716	7,030	0	561	125	-1,877	クイックプロジェクト手法の採用（曲管の利用等）、上水道との同時施工、生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動、市設置型合併浄化槽の推進
	整備面積（集合処理分）（ha）	244.4	244.4	0.0				
目標値	生活排水クリーン処理率（%）	95.0%	83.6%	0.1%	8.1%	3.2%	0.0%	
日平均計画汚水量（m3/日）		42,605	39,580	25	2,955	45	0	
日最大計画汚水量（m3/日）		49,508	45,727	31	3,694	56	0	
概算事業費	総建設事業費（百万円）	3,917	3,875	0		42		
	年間維持管理費（百万円/年）	373	361	3		9		
整備人口1人当たりの建設費用（千円/人）			605	0		336		
実施メニュー	クイックプロジェクト等を利用した整備の実施		○					
	戸別訪問等による転換促進		○		○			
	市設置型合併浄化槽の推進					○		
